Перепланировка квартир

по Московскому проспекту
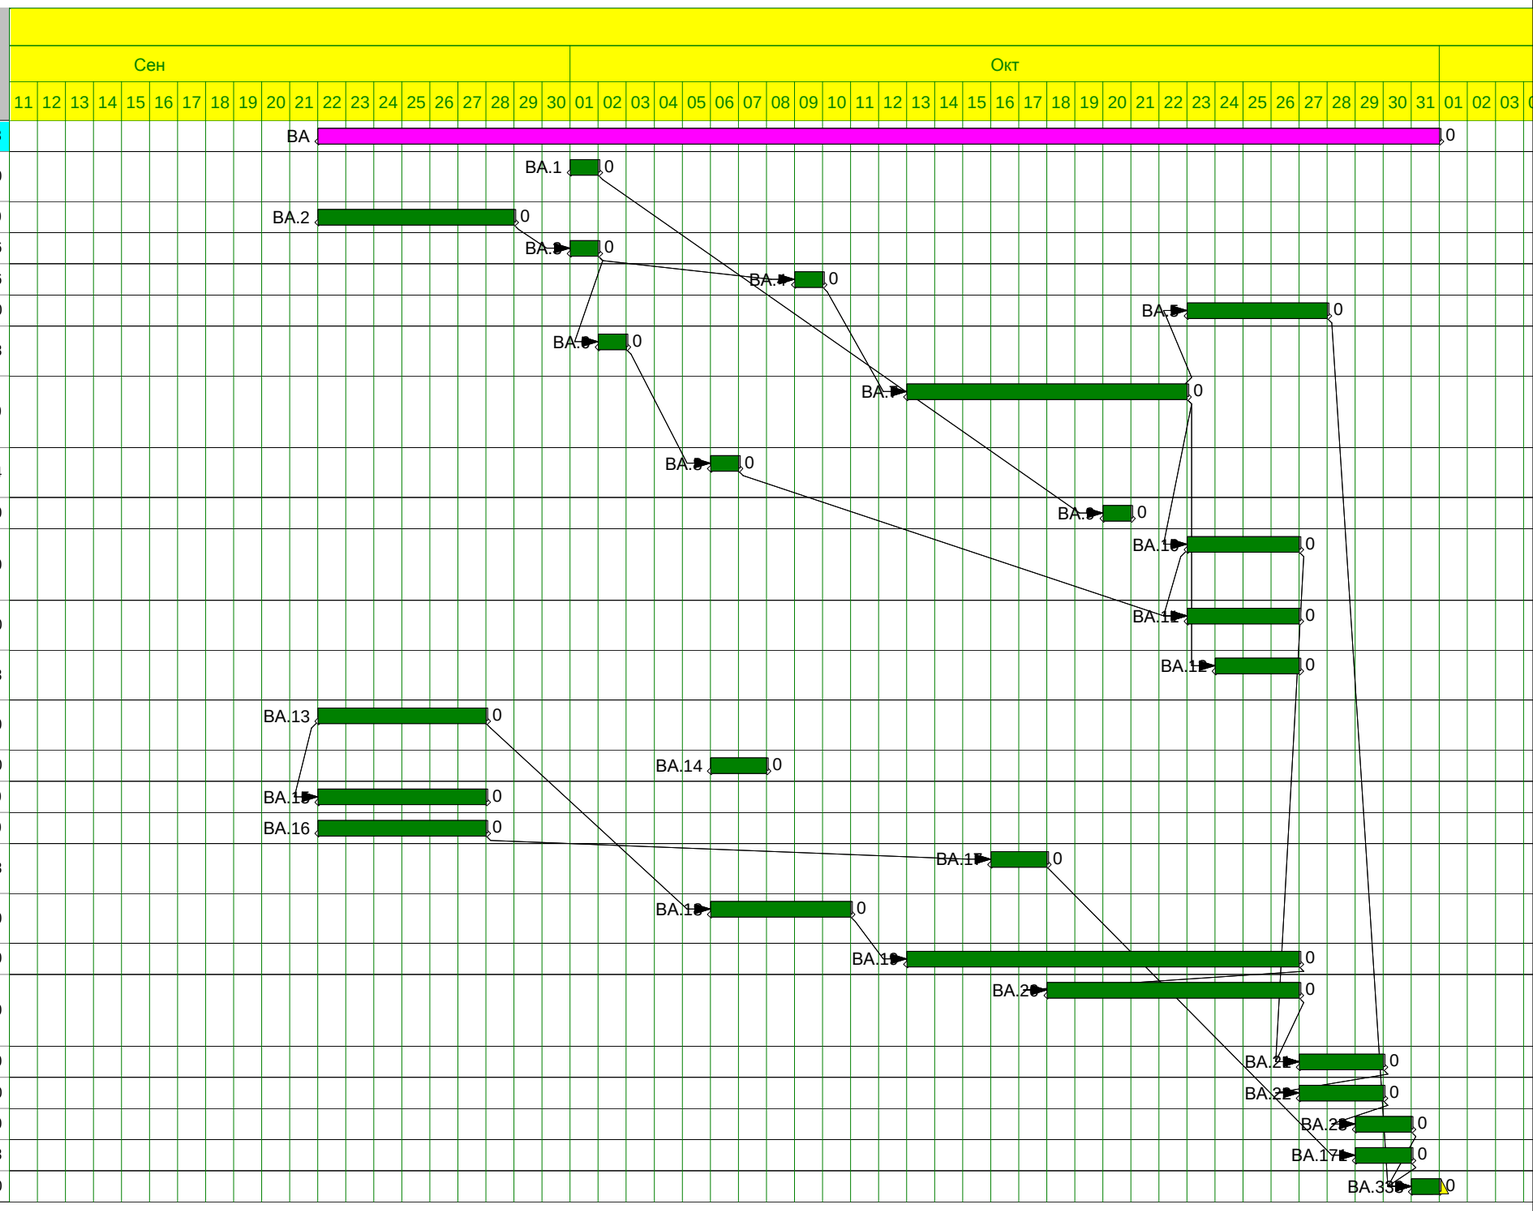
ID	Наименование работ	Длит.	Ранние даты	Плановая стоимость работы, руб
BA	Перепланировка квартир по Московскому проспекту	30d	22Сен08 31Окт08	926 318
BA.1	Демонтаж и монтаж 2-х существующих навесных эл. Щитов 380/220 на 1 этаже здания	2d	01Окт08 01Окт08	50 000
BA.2	Демонтаж кирпичной кладки в заложенных проездах	5d	22Сен08 28Сен08	2 780
BA.3	Установка металлических балок усиления - двутавр 30	2d	01Окт08 01Окт08	61 326
BA.4	Устройство бетонного фундамента до верха балок усиления	1d	09Окт08 09Окт08	66 626
BA.5	Восстановление отмостки	2d	23Окт08 27Окт08	0
BA.6	Установка металлических балок основания дублирующей стены на балки усиления с прваркой между собой двутавр 25	1d	02Окт08 02Окт08	23 398
BA.7	Выполнение кирпичной кладки в проезде и дублирующей стенки с перевязкой через 4 ряда между собой и существующей кладкой арматурой 10 мм	10d	13Окт08 22Окт08	293 000
BA.8	Установка балки (двутавр 25) основания дублирующей стены 2-го этажа	1d	06Окт08 06Окт08	13 724
BA.9	Демонтаж и монтаж электрощита на 2 этаже	1d	20Окт08 20Окт08	20 000
BA.10	Выполнение кирпичной кладки 2-го этажа с перевязкой через 4 ряда между собой и существующей кладкой арматурой 10 мм	2d	23Окт08 26Окт08	47 700
BA.11	Установить гильзу в возводимой стенке 2-го этажа для отопления	1d	23Окт08 26Окт08	600
BA.12	Выполнение металлического обрамления проема на 1-ом этаже с установкой двери	2d	24Окт08 26Окт08	49 328
BA.13	Демонтаж существующих межкомнатных перегородок на 2 этаже	4d	22Сен08 27Сен08	44 570
BA.14	Демонтаж подвесных потолков	1d	06Окт08 07Окт08	0
BA.15	Демонтаж дверей с коробками	4d	22Сен08 27Сен08	6 300
BA.16	Демонтаж дверей с коробками в осях 10 и 8-9	4d	22Сен08 27Сен08	1 400
BA.17	Закладка кирпичем проемов в осях 10 и 8-9 на всю толщину существующей кладки	1d	16Окт08 17Окт08	15 498
BA.18	Возведение перегородок из газобетонных блоков толщиной 150 мм	4d	06Окт08 10Окт08	61 350
BA.19	Штукатурка перегородок из газобетонных блоков	4d	13Окт08 26Окт08	49 550
BA.20	Возведение перегородоки каркасного типа из листов гипсокартона по металлическому каркасу, толщиной 90 мм, с заполнением изовером	4d	18Окт08 26Окт08	46 570
BA.21	Установка дверей	2d	27Окт08 29Окт08	39 600
BA.22	Восстановление пола	2d	27Окт08 29Окт08	0
BA.23	Установка плинтусов	2d	29Окт08 30Окт08	17 500
BA.171	Штукатурка кладки в проемах	1d	29Окт08 30Окт08	15 498
BA.333	Окончание работ	0	31Окт08 31Окт08	0
